ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

KUZEY BÖLGESİ İMALATLARI

		Toplam Çalışma	Gerçekleşen Çalışma	Kalan Çalışma	İlerleme %
1	KUZEY BÖLGESİ GENEL İLERLEMESİ	2.042.317,5 sa	1.448.952,6 sa	593.364,9 sa	70,95%

*** Toplam Adam Saat ve Makine saat ağırlıkları ile hesaplanan Yaklaşık değerdir. Tüm metraj ayrımları kesinleşince değer güncellenecektir.*

1. ETAP KUZEY BÖLGESİ KALAN KRİTİK İMALATLAR RAPORU - 12.10.2026


I -) Genel Proje Hedefi Ekip Sayısı İle Süre Analizi

* Gerçekleşen Fiziksel İlerleme	13,42%
* Planlanan Fiziksel İlerleme	35,46%
* Fiziksel İlerleme Sapması %	-22,04%
* Mevcut Şantiye Direkt İşçi Sayısı	593 Kişi
* Kalan İş İçin Minimum İhtiyaç Ekip Sayısı	898 Kişi
* Fark Direkt İşçi Sayısı + / -	305 Kişi
* Fark Direkt İşçi Sayısı Oranı % + / -	51,38%
* Bu Ekip Sayısıyla Gidilirse Uzayacak Süre	-63 gün
* **Mevcut ekip sayısıyla Tahmini Son Tarih**	**03.Mar.27**

II -) Rapor Tarihi İle Fiz% Süre Analizi

Başlangıç	01.Eyl.26	
Bitiş	31.Ara.26	
Süre (Takvim günü)	122 gün	
Çalışılmayan Süre Yaklaşık	10 gün	
Toplam Net İş Süresi	112 gün	
Geçen Net İş Süresi	91,80%	39 gün
Kalan Net Süre	73 gün	
Fiz.İler. Kayıp Süre +/-	-27 gün	
Rapor İtibarı İle Son Tarih	**26.Oca.27**	

Genel İlerleme ve İmalat Hız Grafiği




III-) İş Programında İlerlemesi Olan İmalat Hızı Ölçümlerine Göre Son Tarih — **30.Eki.33**

I-II-III Analiz Sonucu İşin Son Tarihi — **30.Eki.33**

*** İmalatta fiziksel ilerleme ileride bile görülse ileriye dönük mevcuda da bakılır bunlarda yeterli ise yapılmayan yavaş yapılan iş kalemine göre bakılır. Ancak 3 kriterin aynı anda erken göründüğü durumda en geç iş bitimi değeri kullanılarak işin erken bitebileceği söylenebilir. Bu noktada İleride işin bir kaleminin yapılmaması halinde iş gene gecikir.*


Haftalık Fiziksel İlerleme Periyot Performans Grafiği

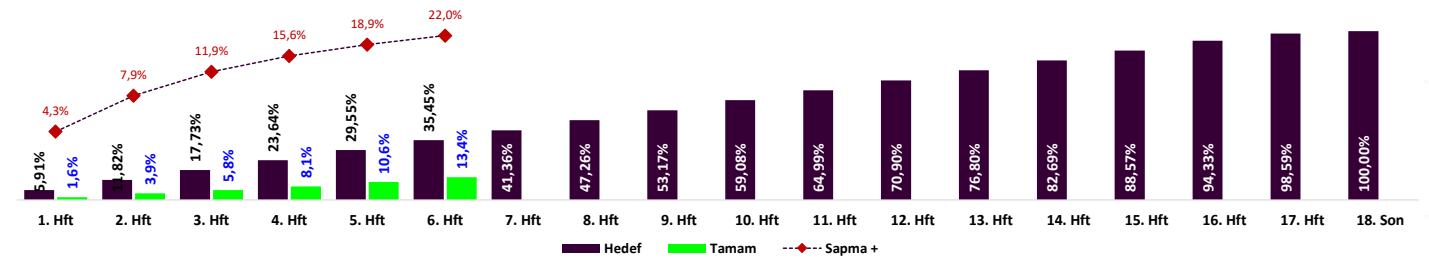

ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ			1.09.2026 TARİHİNDEN SONRASI KUZEY BÖLGESİ KALAN İŞLER				PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ			SÜRE ÖLÇÜMLERİ		
1. ETAP KUZEY BÖLGESİ KALAN İŞLER - İŞ PROGRAMI			FİZİKSEL İLERLEME %				GÜNLÜK İMALAT HIZLARI			MEVCUT HIZA GÖRE DURUM		
SR	PROJE İŞ KALEMLERİ	BR	AĞIRLIK	TAMAM	PLANL.	SAPMA	HEDEF HIZ	GERÇ HIZ	FARK HIZ	SAPMA (%)	GECİKME	SON TARİH
A	YOL, PARSEL ve İHATA İNŞAATI	%	70,80%	10,29%	25,01%	-14,72%						
1	PARSEL DOLGULARI (ZM ISLAHI+NİT DOLG.)	m³	3,14%	29,82%	34,43%	-4,60%	3.225	2.082	-1.143	-35,43%	40 Gün	02.Şub.27
2	YOL DOLGULARI (ALT TEM. ALTI ZM. ISLAHI)	m³	4,24%	7,42%	34,43%	-27,00%	5.519	854	-4.665	-84,53%	401 Gün	29.Oca.28
3	İSTİNAT DUVARI PARSEL - PARSEL	m³	12,68%	16,23%	34,43%	-18,20%	337	266	-71	-20,98%	19 Gün	12.Oca.27
4	İSTİNAT DUVARI YOL- PARSEL	m³	16,81%	30,96%	37,50%	-6,54%	416	183	-233	-56,06%	82 Gün	07.Mar.27
5	TOPRAKARME PANEL ÜRETİM	m²	2,54%	13,83%	38,89%	-25,05%	510	165	-345	-67,65%	127 Gün	17.Nis.27
6	TOPRAKARME DUVAR İMALATLARI	m³	31,39%	4,53%	34,43%	-29,90%	6.365	842	-5.523	-86,77%	482 Gün	19.Nis.28
B	İÇMESUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	0,86%	0,02%	0,31%	-0,28%						
7	İÇ.SUYU HATTI PE BORU ŞEB. İMALATLARI	mt	0,29%	8,08%	35,90%	-27,81%	187	5	-182	-97,33%	2507 Gün	30.Eki.33
8	İÇ.SUYU HATTI İMALATI ÇELİK BORU	mt	0,57%		35,90%	-35,90%	53					
C	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	2,04%	0,46%	0,75%	-0,29%						
9	ATIKSU HATTI İMALATI (Boru+Mhol)	mt	1,44%	26,66%	35,90%	-9,24%	83	62	-22	-26,03%	24 Gün	13.Oca.27
10	ATIKSU TERFİ MERKZ. VE HATLARI	m³	0,60%	13,27%	39,25%	-25,98%	3					
D	YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	5,28%	0,54%	1,89%	-1,36%						
11	YAĞM.SUYU HATTI İMALATI (Boru+Mhol)	mt	2,62%	20,42%	35,90%	-15,47%	137	88	-49	-35,65%	38 Gün	26.Oca.27
12	YAĞM.SUYU 2,5X2,5m KUTU KESİT HAT	mt	2,44%		35,90%	-35,90%	18					
13	YAĞM.SUYU GİRİŞ AĞZ. IZGARALARI	Ad	0,22%		35,29%	-35,29%	8					
E	DOĞALGAZ ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	1,04%	0,02%	0,37%	-0,35%						
14	DOĞALGAZ ÇELİK BORU HATLARI	mt	0,38%		35,90%	-35,90%	87					
15	DOĞALGAZ PE BORU HATLARI	mt	0,66%	3,41%	35,90%	-32,49%	236					
F	ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	15,21%	2,02%	5,42%	-3,40%						
16	ELEKTRİK HATTI İMALATI (BORUL. MENHOL)	mt	8,57%	16,88%	35,90%	-19,02%	243	91	-152	-62,40%	114 Gün	13.Nis.27
17	ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİ	m³	5,34%	9,81%	34,43%	-24,62%	65					
18	ÇUBUK ÇAYI GEÇİŞİ (HAVAİ & SONDAJ)	%Ad	0,36%		45,65%	-45,65%	2					
19	CAD. AYDIN. HATTI TESİSİ (Boru+Mhol)	mt	0,95%	4,95%	35,90%	-30,94%	156					
G	HABERLEŞME ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	4,77%	0,07%	1,71%	-1,64%						
20	HABERLEŞME HATTI İM. (Boru+Mhol)	mt	4,77%	1,51%	35,90%	-34,38%	319	48	-271	-84,88%	387 Gün	10.Oca.28

ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

PROJE GENEL İLERLEME VE DURUM RAPORU - 12.10.2026

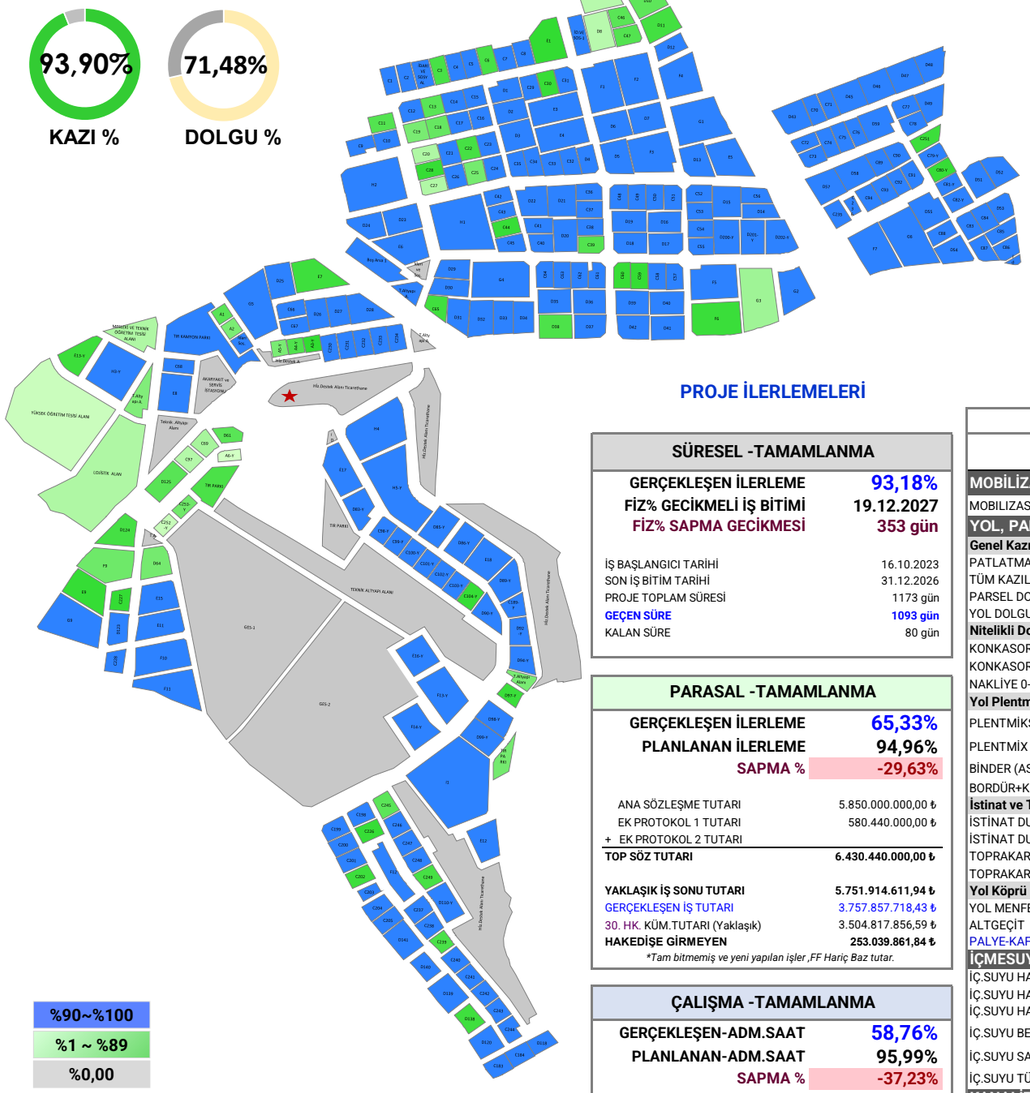

PROJE İLERLEMELERİ

SÜRESEL -TAMAMLANMA	
GERÇEKLEŞEN İLERLEME	93,18%
FİZ% GEÇİKMELİ İŞ BİTİMİ	19.12.2027
FİZ% SAPMA GECİKMESİ	353 gün
İŞ BAŞLANGICI TARİHİ	16.10.2023
SON İŞ BİTİM TARİHİ	31.12.2026
PROJE TOPLAM SÜRESİ	1173 gün
GEÇEN SÜRE	1093 gün
KALAN SÜRE	80 gün


PARASAL -TAMAMLANMA	
GERÇEKLEŞEN İLERLEME	65,33%
PLANLANAN İLERLEME	94,96%
SAPMA %	-29,63%
ANA SÖZLEŞME TUTARI	5.850.000.000,00 ₺
EK PROTOKOL 1 TUTARI	580.440.000,00 ₺
+ EK PROTOKOL 2 TUTARI	
TOP SÖZ TUTARI	6.430.440.000,00 ₺
YAKLAŞIK İŞ SONU TUTARI	5.751.914.611,94 ₺
GERÇEKLEŞEN İŞ TUTARI	3.757.857.718,43 ₺
30. HK. KÜM.TUTARI (Yaklaşık)	3.504.817.856,59 ₺
HAKEDİŞE GİRMEYEN	253.039.861,84 ₺


**Tam bitmemiş ve yeni yapılan işler ,FF Hariç Baz tutar.*

ÇALIŞMA -TAMAMLANMA	
GERÇEKLEŞEN-ADM.SAAT	58,76%
PLANLANAN-ADM.SAAT	95,99%
SAPMA %	-37,23%
TOPLAM DİREKT ADAM.SAAT	4.056.695,57
GERÇ. DİREKT ADAM.SAAT	2.383.671,16
GERÇ. ENDİREKT ADAM.SAAT	871.439,00
GERÇEKLEŞEN-MAK.SAAT	70,85%
PLANLANAN-MAK.SAAT	96,53%
SAPMA %	-25,67%
TOPLAM MAKİNA.SAAT	2.515.406,97
GERÇEKLEŞEN MAKİNA.SAAT	1.782.271,33
GERÇ. ENDİREKT MAKİNA.SAAT	594.766,00

FİZİKSEL-TAMAMLANMA		
GERÇEKLEŞEN FİZİKSEL %	66,17%	
PLANLANAN FİZİKSEL %	96,26%	
SAPMA %	-30,10%	
FİZİKSEL% -ADAM.SAAT	*58,76%*	
Ağırlık: 38,75%		22,77%
FİZİKSEL% - MAKİNA.SAAT	*70,85%*	
Ağırlık: 61,25%		43,40%

GENEL VAZİYET PLANI KAZI İMALAT İLERLEME GRAFİĞİ

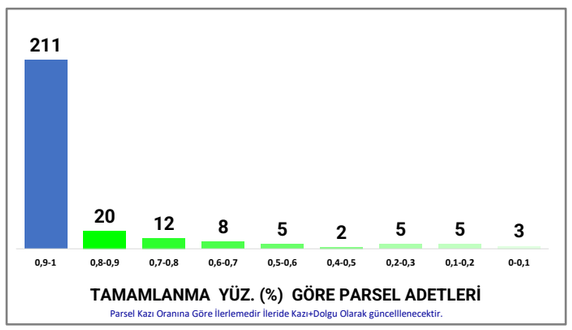

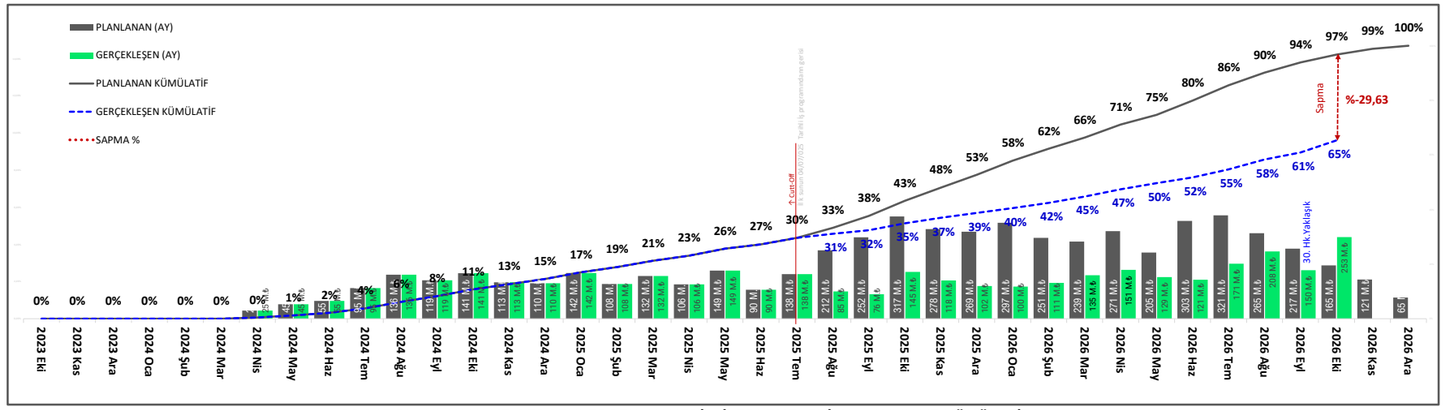

PROJE PLANLANAN VE GERÇEKLERŞEN HAKEDİŞ İLERLEMELERİ % (AYLIK VE KÜMÜLATİF)

PROJE İLERLEMELERİ HIZ, SÜRE , TAM % vb. -PROGRESS DATA -ÖLÇÜMLERİ

1.09.2047

İŞ PROGRAMI PROJE GÖREV BİLGİLERİ				İŞ PROGRAMINA GÖRE İLERLEMELER ve SAPMALAR						MEVCUT İMALAT HIZINA GÖRE GECİKMELER ve TAHMİNİ İŞ BİTİMİ					
PROJE İŞ KALEMLERİ	BR	İŞ PROGRAMI BAŞLA.	İŞ PROGRAMI BİTİŞ	İMALAT MİKTARI TOPLAM	İMALAT MİKTARI YAPILAN	İMALAT MİKTARI KALAN	FİZİKSEL İLERLEME % TAMAM	FİZİKSEL İLERLEME % PLANL.	FİZİKSEL İLERLEME % SAPMA	Planlanan Gün.HIZ	7 Günlük Ortlm.HIZ	Fark +/ - Gün HIZ	İMLT. HIZ SAPMA (%)	İML. HIZ GECİKME	BU HIZ İÇİN SON TARİH
MOBİLİZASYON ve ŞANTİYE İŞLETME	%	20.Eki.23	01.Haz.26	% 100,0	% 91,8	% 8,2	% 91,83	% 100,00	- % 8,17						
MOBILIZASYON VE GENEL İŞLER	sa	20.Eki.23	01.Haz.26	14.040	**12.893**	1.147	% 91,83	% 100,00	% 8,17 -	1.147					
YOL, PARSEL ve İHATA İNŞAATI	%	18.Mar.24	31.Ara.26	% 100,0	% 71,7	% 28,3	% 71,75	% 96,49	- % 24,74						
Genel Kazı, Patlatma ve Dolgu İşleri															
PATLATMALAR (PARSEL+YOL+ŞEV)	m³	12.Tem.24	09.Haz.26	8.150.000	**7.533.448**	616.552	% 92,43	% 100,00	% 7,57 -	616.552	**3.615**	-612.937	-99,41%	296 Gün	**1.04.2027**
TÜM KAZILAR (PARSEL+YOL+ŞEV)	m³	18.Mar.24	17.Tem.26	32.771.251	**30.773.755**	1.997.496	% 93,90	% 100,00	% 6,10 -	1.997.496	**19.085**	-1.978.411	-99,04%	192 Gün	**25.01.2027**
PARSEL DOLGULARI (ZM ISLAHI+NİT DOLG.)	m³	03.Kas.24	14.Ara.26	4.000.000	**3.017.212**	982.788	% 75,43	% 86,74	% 11,31 -	17.242	**4.165**	-13.077	-75,84%	173 Gün	**5.06.2027**
YOL DOLGULARI (ALT TEM. ALTI ZM. ISLAHI)	m³	24.Haz.25	19.Eki.26	2.000.000	**1.271.818**	728.182	% 63,59	% 97,36	% 33,77 -	121.364	**1.708**	-119.656	-98,59%	419 Gün	**12.12.2027**
Nitelikli Dolgu Malzemesi Üretilmesi															
KONKASOR Genel Malz. ÜRETİMİ (Yüklenciye)	ton	24.Haz.25	03.Kas.26	5.345.000	**1.144.663**	4.200.337	% 21,42	% 95,56	% 74,14 -	210.017	**3.243**	-206.774	-98,46%	1273 Gün	**29.04.2030**
KONKASOR 0-63 mm Malz. ÜRETİMİ (Parsellere)	ton	24.Haz.25	05.Ara.26	4.000.000	**3.575.335**	424.665	% 89,38	% 89,79	% 0,41 -	8.667	**6.840**	-1.827	-21,08%	8 Gün	**13.12.2026**
NAKLİYE 0-63 mm Malz. PARSEL DOLGU İÇİN	ton	08.Tem.25	19.Ara.26	4.000.000	**2.502.452**	1.497.548	% 62,56	% 87,08	% 24,52 -	24.154	**361**	-23.793	-98,51%	4084 Gün	**23.02.2038**
Yol Plentmix, Asfalt , Kaldırım Bordür															
PLENTMİKS ALTTEMEL YAPILMASI	ton	09.Tem.26	14.Kas.26	316.800		316.800		% 74,17	% 74,17 -	10.219					
PLENTMİX ÜST TEMEL YAPILMASI	ton	20.Tem.26	25.Kas.26	234.300		234.300		% 65,83	% 65,83 -	5.715					
BİNDER (ASFALT) TABAKASI	ton	05.Ağu.26	31.Ara.26	101.520		101.520		% 46,04	% 46,04 -	1.354					
BORDÜR+KİLİT TAŞI KALDIRIM	m²	05.Ağu.26	31.Ara.26	180.000		180.000		% 47,17	% 47,17 -	2.400					
İstinat ve Toprakarme Dayanma Yapıları															
İSTİNAT DUVARI PARSEL - PARSEL	m³	17.Ara.24	18.Ara.26	125.337	**70.826**	54.511	% 56,51	% 97,30	% 40,79 -	909	**266**	-642	-70,71%	138 Gün	**5.05.2027**
İSTİNAT DUVARI YOL- PARSEL	m³	08.Şub.25	31.Ağu.26	111.680	**62.579**	49.101	% 56,03	% 100,00	% 43,97 -	49.101	**183**	-48.919	-99,63%	311 Gün	**8.07.2027**
TOPRAKARME PANEL ÜRETİM	m²	02.May.25	15.Kas.26	100.000	**28.210**	71.790	% 28,21	% 94,00	% 65,79 -	2.991	**165**	-2.826	-94,49%	401 Gün	**21.12.2027**
TOPRAKARME DUVAR İMALATLARI	m³	10.Eki.25	22.Ara.26	1.000.000	**122.755**	877.245	% 12,28	% 90,15	% 77,88 -	13.707	**842**	-12.865	-93,86%	971 Gün	**19.08.2029**
Yol Köprü ve Şev Sanat Yapıları															
YOL MENFEZLERİNİN YAPILMASI	m³	22.Şub.26	13.Tem.26	901	**220**	681	% 24,42	% 100,00	% 75,58 -	681	**10**	-671	-98,49%	157 Gün	**17.12.2026**
ALTGEÇİT YAPILMASI (İHALE PRJ.)	m³	12.Haz.26	18.Eki.26	4.247		4.247		% 95,00	% 95,00 -	708					
PALYE-KAFA HENDEK + DÜŞÜM OLUKLARI	mt	24.Ara.25	19.Kas.26	26.665	**759**	25.906	% 2,85	% 99,36	% 96,52 -	762					
İÇMESUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	01.Eyl.25	20.Kas.26	% 100,0	% 28,1	% 71,9	% 28,07	% 98,77	- % 70,70						
İÇ.SUYU HATTI PE BORU ŞEBEKE İMALATLARI	mt	01.Eyl.25	20.Kas.26	47.500	**9.353**	38.147	% 19,69	% 97,53	% 77,84 -	1.090	5	-1.085	-99,54%	7590 Gün	1.09.2047
İÇ.SUYU HATTI PE BORU DEPOLAR ARASI İML.	mt	17.Şub.26	09.Ağu.26	6.700		6.700		% 100,00	% 100,00 -	6.700					
İÇ.SUYU HATTI İMALATI ÇELİK BORU	mt	17.Şub.26	09.Ağu.26	6.800		6.800		% 100,00	% 100,00 -	6.800					
İÇ.SUYU BETONARME SU DEPOLARI	m³	21.Kas.25	09.Ağu.26	8.848	**3.798**	5.050	% 42,93	% 100,00	% 57,07 -	5.050	**1**	-5.049	-99,99%	7134 Gün	**19.02.2046**
İÇ.SUYU SANAT YAPILARI (TM,VO vb.)	m³	17.Şub.26	26.Eyl.26	1.204	**126**	1.078	% 10,49	% 100,00	% 89,51 -	1.078	**7**	-1.070	-99,32%	164 Gün	**9.03.2027**
İÇ.SUYU TÜM ELEKTRİK İŞLERİ	%Ad	03.May.26	20.Kas.26	100		100		% 80,56	% 80,56 -	3					
KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	15.Mar.25	19.Eki.26	% 100,0	% 48,2	% 51,8	% 48,18	% 98,85	- % 50,68						
ATIKSU HATTI İMALATI (Boru+Mhol)	mt	15.Mar.25	19.Eki.26	44.770	**22.418**	22.352	% 50,07	% 98,02	% 47,94 -	3.725	**62**	-3.664	-98,35%	356 Gün	**10.10.2027**
ATIKSU TERFİ MERKZ. VE HATLARI	m³	15.May.26	19.Eki.26	350	**124**	226	% 35,41	% 99,78	% 64,38 -	38					
ATIKSU DEŞARJ - ÇELİK KÖPRU	%Ad	15.May.26	29.Eyl.26	100		100		% 100,00	% 100,00 -	100					
YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	21.Mar.25	26.Kas.26	% 100,0	% 21,9	% 78,1	% 21,95	% 98,08	- % 76,14						
YAĞM.SUYU HATTI İMALATI (Boru+Mhol)	mt	21.Mar.25	26.Kas.26	46.650	**16.755**	29.895	% 35,92	% 97,77	% 61,85 -	747	**88**	-660	-88,24%	295 Gün	**17.09.2027**
YAĞM.SUYU 2,5X2,5m KUTU KESİT HAT	mt	02.Mar.26	22.Ağu.26	1.300		1.300		% 100,00	% 100,00 -	1.300					
YAĞM.SUYU SANAT YAPILARI	m³	27.Mar.26	17.Ağu.26	265		265		% 100,00	% 100,00 -	265					
YAĞM.SUYU GİRİŞ AĞZ. IZGARALARI	Ad	18.Ağu.26	21.Kas.26	1100		1.100		% 58,89	% 58,89 -	29					
DOĞALGAZ ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	21.May.25	26.Eki.26	% 100,0	% 10,7	% 89,3	% 10,69	% 91,39	- % 80,70						
DOĞALGAZ ÇELİK BORU HATLARI	mt	14.Kas.25	17.Eki.26	10.050		10.050		% 97,26	% 97,26 -	2.513					
DOĞALGAZ PE BORU HATLARI	mt	20.Ara.25	13.Eki.26	38.185	**6.243**	31.942	% 16,35	% 99,25	% 82,90 -	31.942					
DOĞALGAZ İSTASYONLARI	Ad	27.Ağu.26	26.Eki.26	6		6				0					
ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	20.Kas.24	31.Ara.26	% 100,0	% 26,8	% 73,2	% 26,81	% 91,61	- % 64,80						
ELEKTRİK HATTI İMALATI (BORULAMA MENHOL)	mt	28.Haz.25	03.Kas.26	42.770	**10.063**	32.707	% 23,53	% 93,94	% 70,41 -	1.635	**91**	-1.544	-94,41%	336 Gün	**5.10.2027**
ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİ	m³	21.Ağu.25	16.Ara.26	12.650	**6.757**	5.893	% 40,06	% 90,48	% 50,41 -	100					
ELEKTRİK ÇUBUK ÇAYI GEÇİŞİ (HAVAİ & SONDAJ)	%Ad	30.Oca.26	23.Mar.26	100		100		% 100,00	% 100,00 -	100					
CAD. AYDIN. HATTI TESİSİ (Boru+Mhol)	mt	05.Oca.26	16.Eyl.26	25.205	**560**	24.645	% 2,22	% 100,00	% 97,78 -	24.645					
CAD. AYDIN. HATTI KABLOLAMALARI	mt	06.Şub.26	12.Eki.26	55.000		55.000		% 100,00	% 100,00 -	55.000					
CAD. AYDIN. DİREK +ARMT İMALATLARI	Ad	13.Eki.26	31.Ara.26	1.314		1.314									
HABERLEŞME ŞEBEKESİ İNŞAATI	%	19.Kas.25	03.Kas.26	% 100,0	% 0,7	% 99,3	% 0,75	% 92,31	- % 91,56	> En Yavaş					
HABERLEŞME HATTI İM. (Boru+Mhol)	mt	15.Oca.26	03.Kas.26	45.200	**338**	44.862	% 0,75	% 92,31	% 91,56 -	2.243	**48**	-2.195	-97,85%	907 Gün	**28.04.2029**


ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

PROJE - İKİ RAP. DÖNEMİ ARASI GEÇEN GÜNE GÖRE PERFORMANS RAPORU - PERİYOT 3 AY (ÇeyrekYıl) - 12.10.2026


*** ŞANTİYE DİREK İŞÇİ MEVCUDU (Kişi) / Bu Rapor ve Önceki Rapor Arası Geçen Süre (7 Gün)**

!! İş programına göre süresi biten işlerde hedefler çok fazla görülür.

GÜNLÜK ORTALAMA MİKTARLAR (Periyodik Ortalama 2 rapor tarihi arası Geçen Güne Göre)

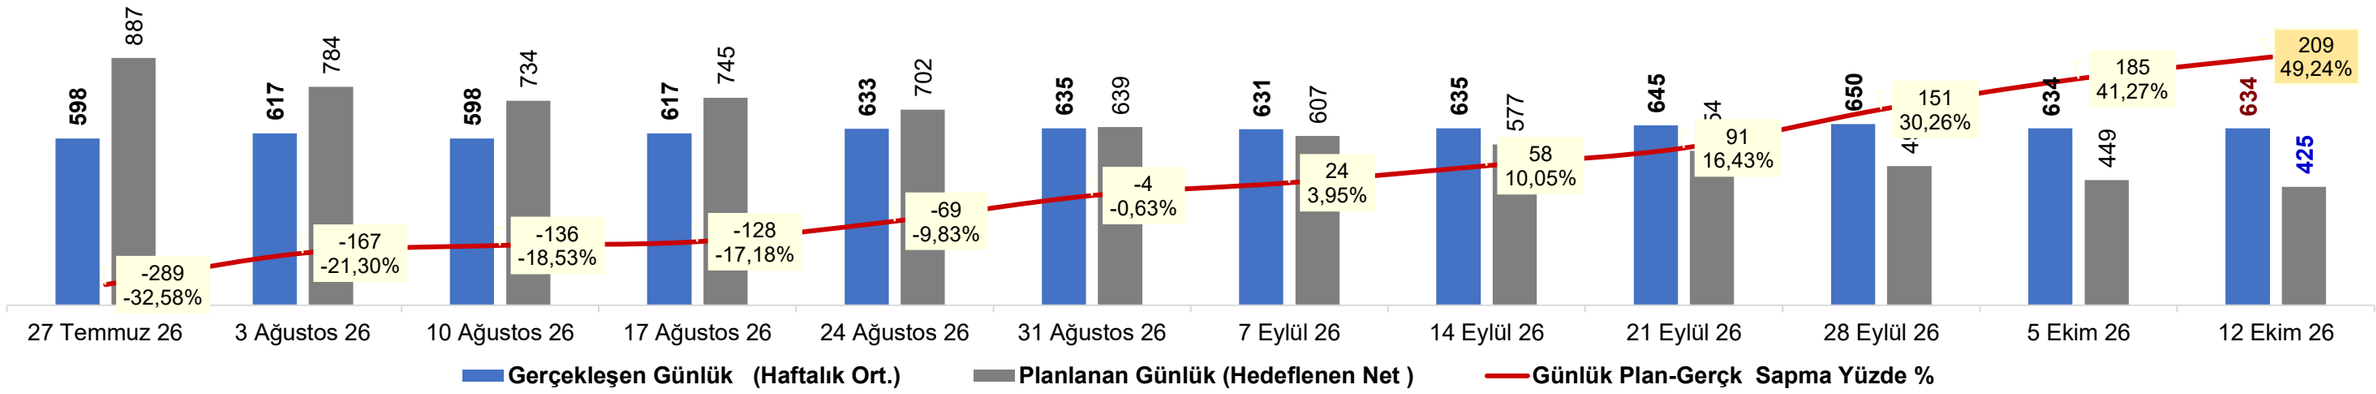

KÜMÜLATİF MİKTARLAR

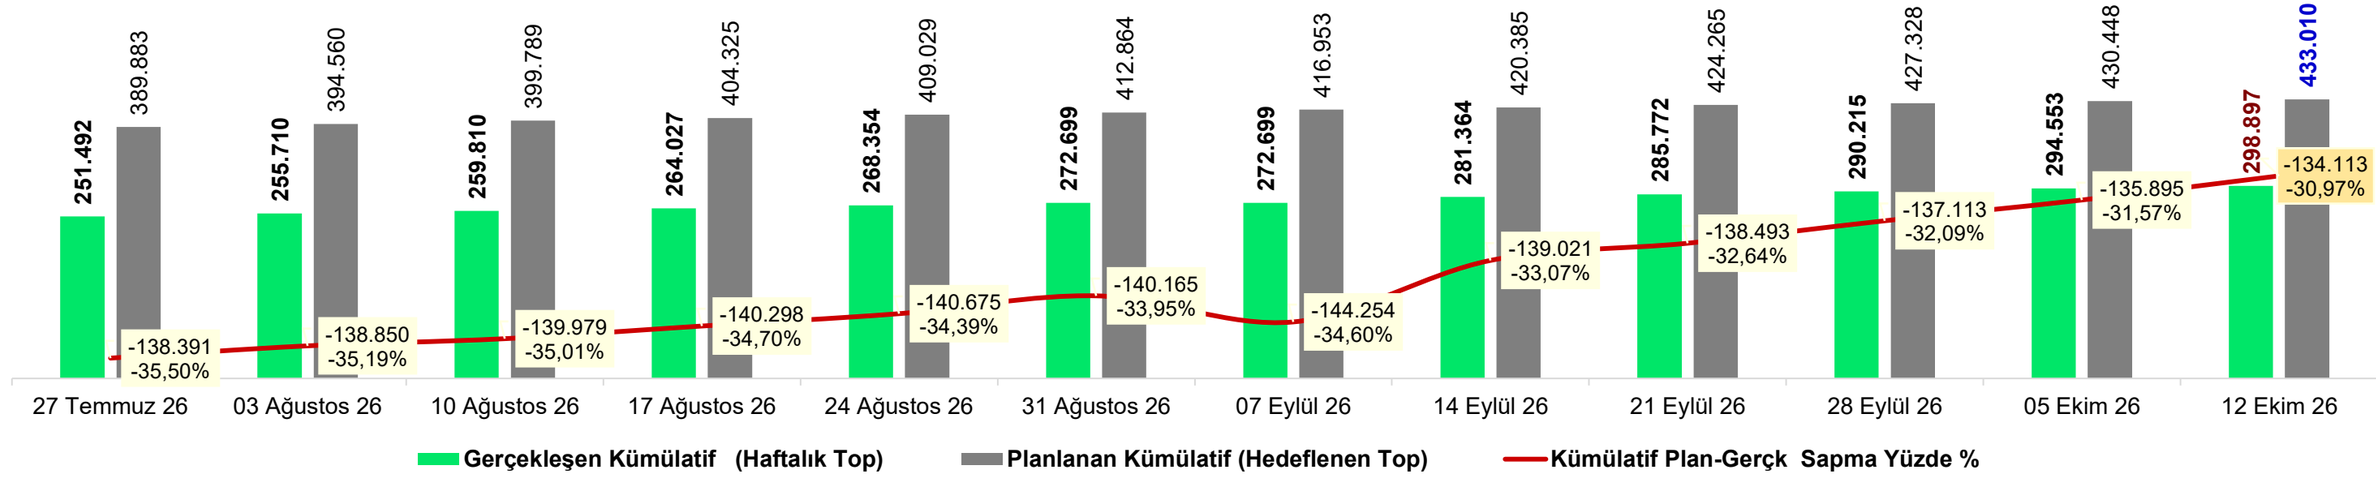


ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

PROJE - İKİ RAP. DÖNEMİ ARASI GEÇEN GÜNE GÖRE PERFORMANS RAPORU - PERİYOT 3 AY (ÇeyrekYıl) - 12.10.2026


TÜM KAZILAR (PARSEL+YOL+ŞEV) (m³) / Bu Rapor ve Önceki Rapor Arası Geçen Süre (7 Gün)

!! İş programına göre süresi biten işlerde hedefler çok fazla görülür.

GÜNLÜK ORTALAMA MİKTARLAR (Periyodik Ortalama 2 rapor tarihi arası Geçen Güne Göre)

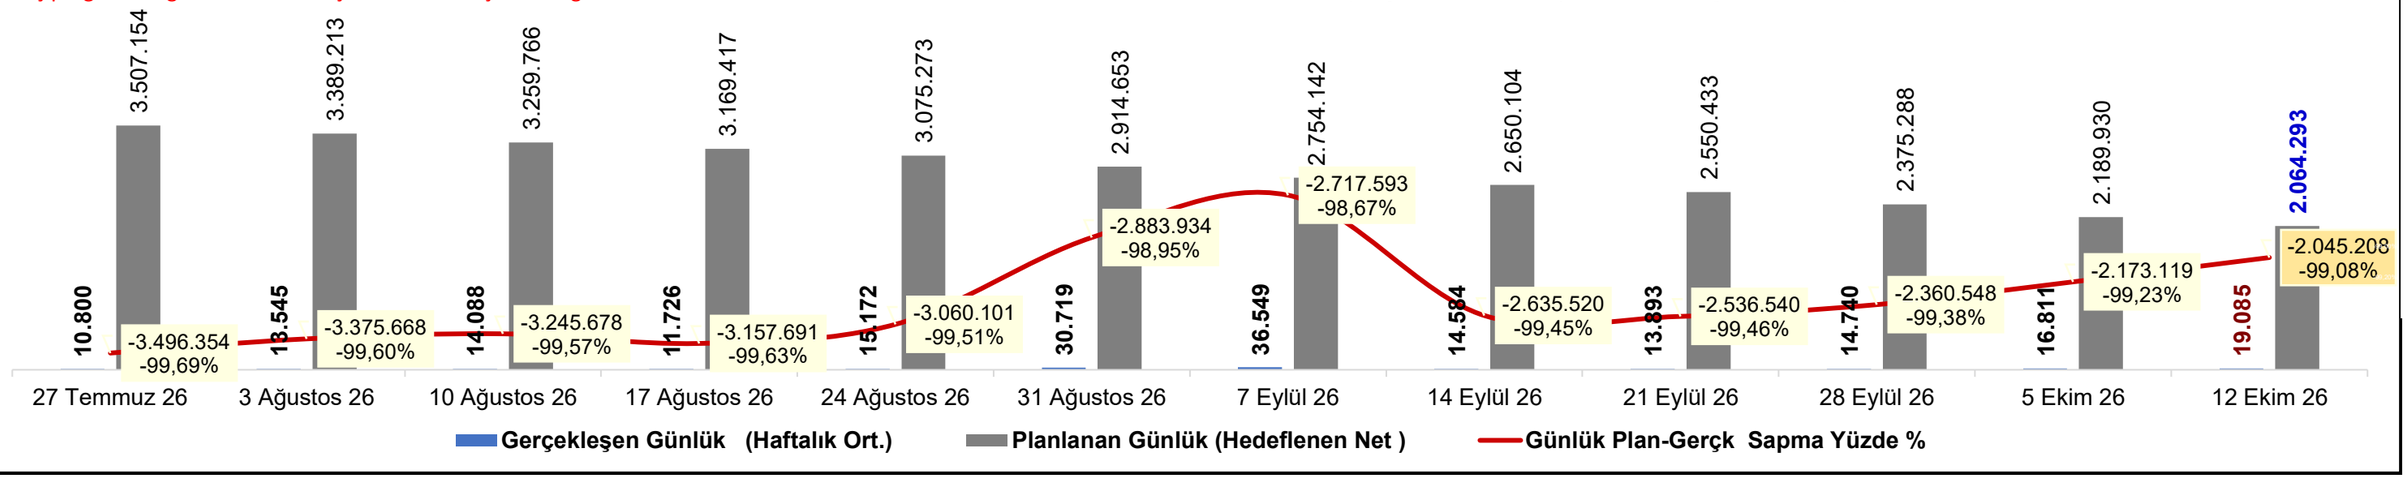

KÜMÜLATİF MİKTARLAR

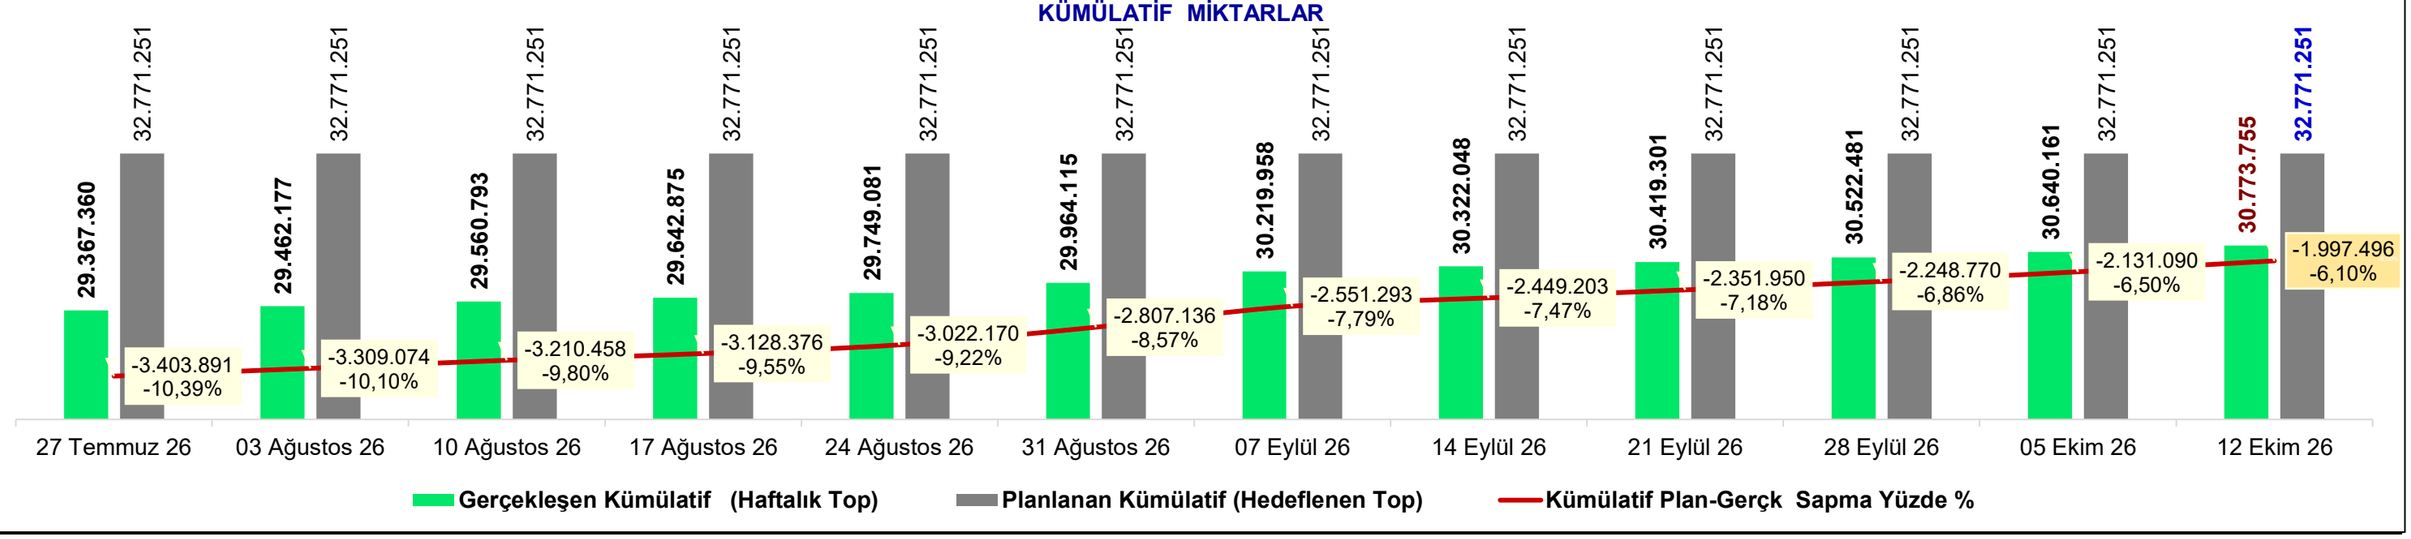


ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

PROJE - İKİ RAP. DÖNEMİ ARASI GEÇEN GÜNE GÖRE PERFORMANS RAPORU - PERİYOT 3 AY (ÇeyrekYıl) - 12.10.2026


PARSEL VE YOL G.TOPLAM DOLGULARI (m³) / Bu Rapor ve Önceki Rapor Arası Geçen Süre (7 Gün)

!! İş programına göre süresi biten işlerde hedefler çok fazla görülür.

GÜNLÜK ORTALAMA MİKTARLAR (Periyodik Ortalama 2 rapor tarihi arası Geçen Güne Göre)

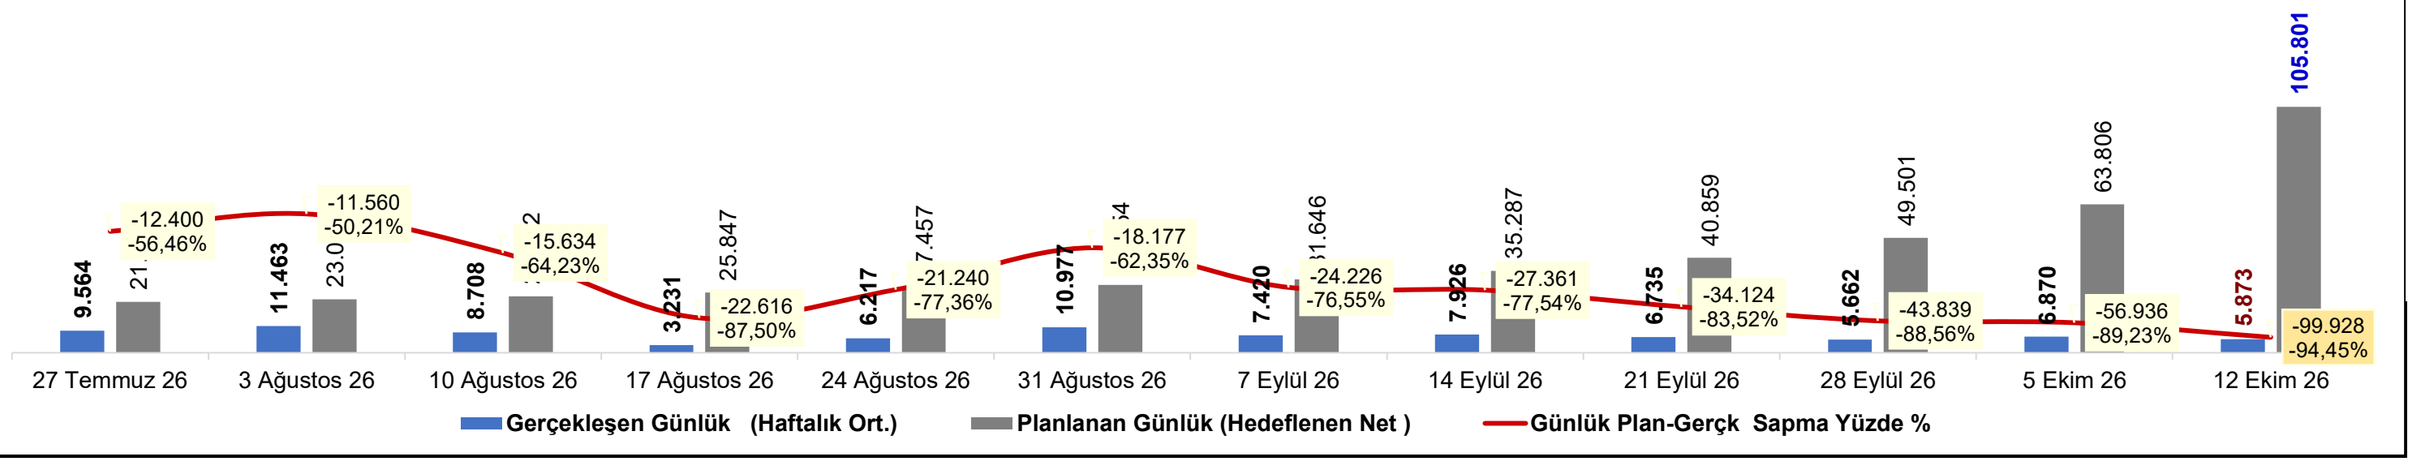

KÜMÜLATİF MİKTARLAR

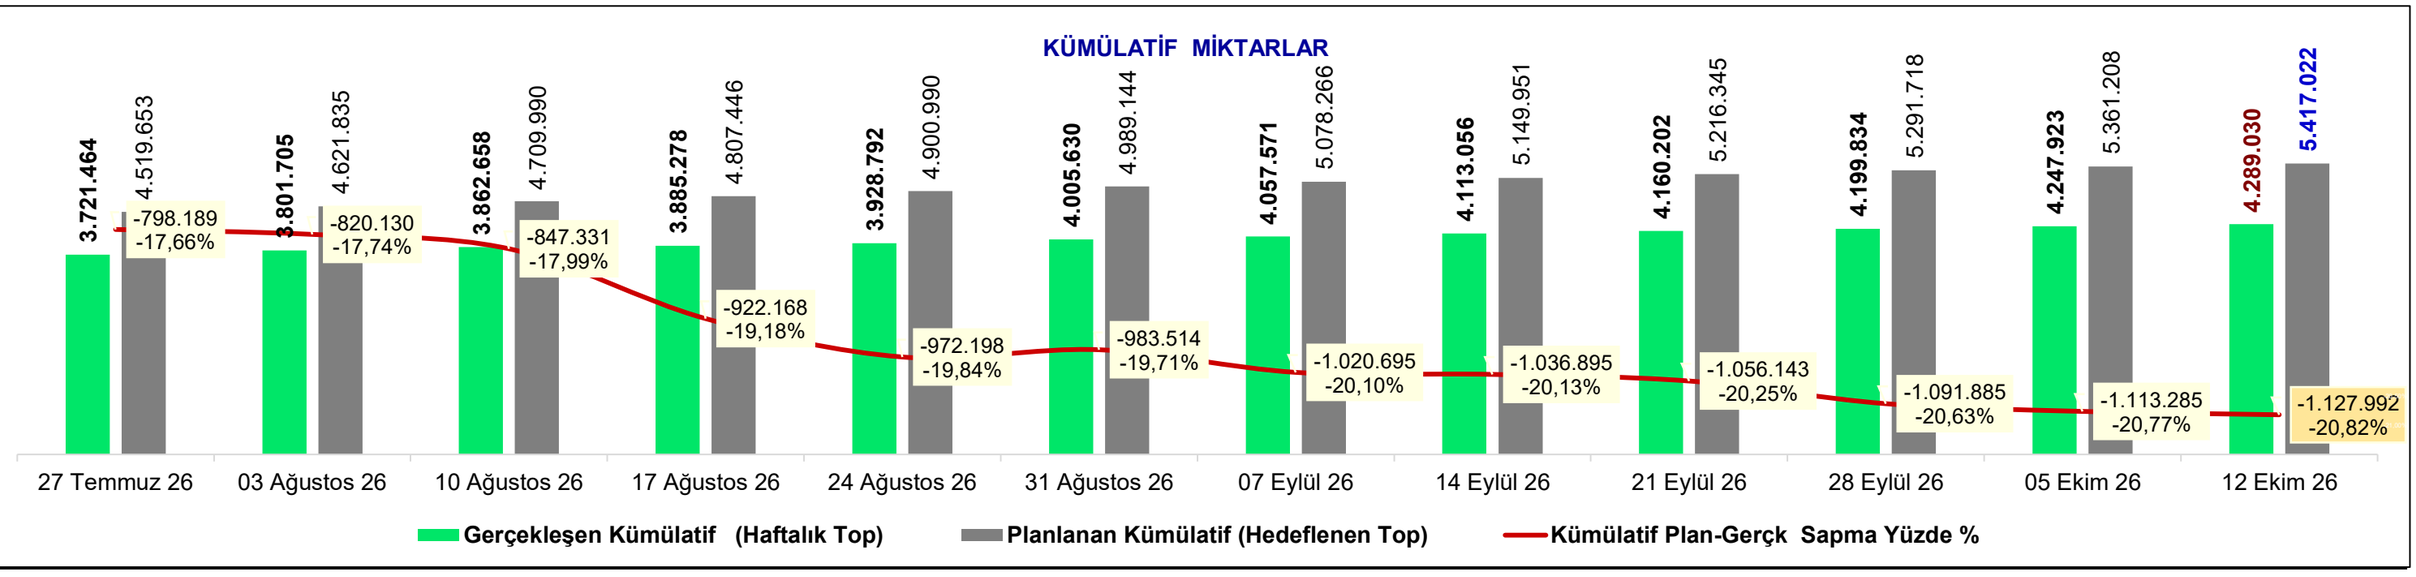


ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

PROJE - İKİ RAP. DÖNEMİ ARASI GEÇEN GÜNE GÖRE PERFORMANS RAPORU - PERİYOT 3 AY (ÇeyrekYıl) - 12.10.2026


KONKASOR G.TOPLAM MALZEME ÜRETİMİ (ton) / Bu Rapor ve Önceki Rapor Arası Geçen Süre (7 Gün)

!! İş programına göre süresi biten işlerde hedefler çok fazla görülür.

GÜNLÜK ORTALAMA MİKTARLAR (Periyodik Ortalama 2 rapor tarihi arası Geçen Güne Göre)

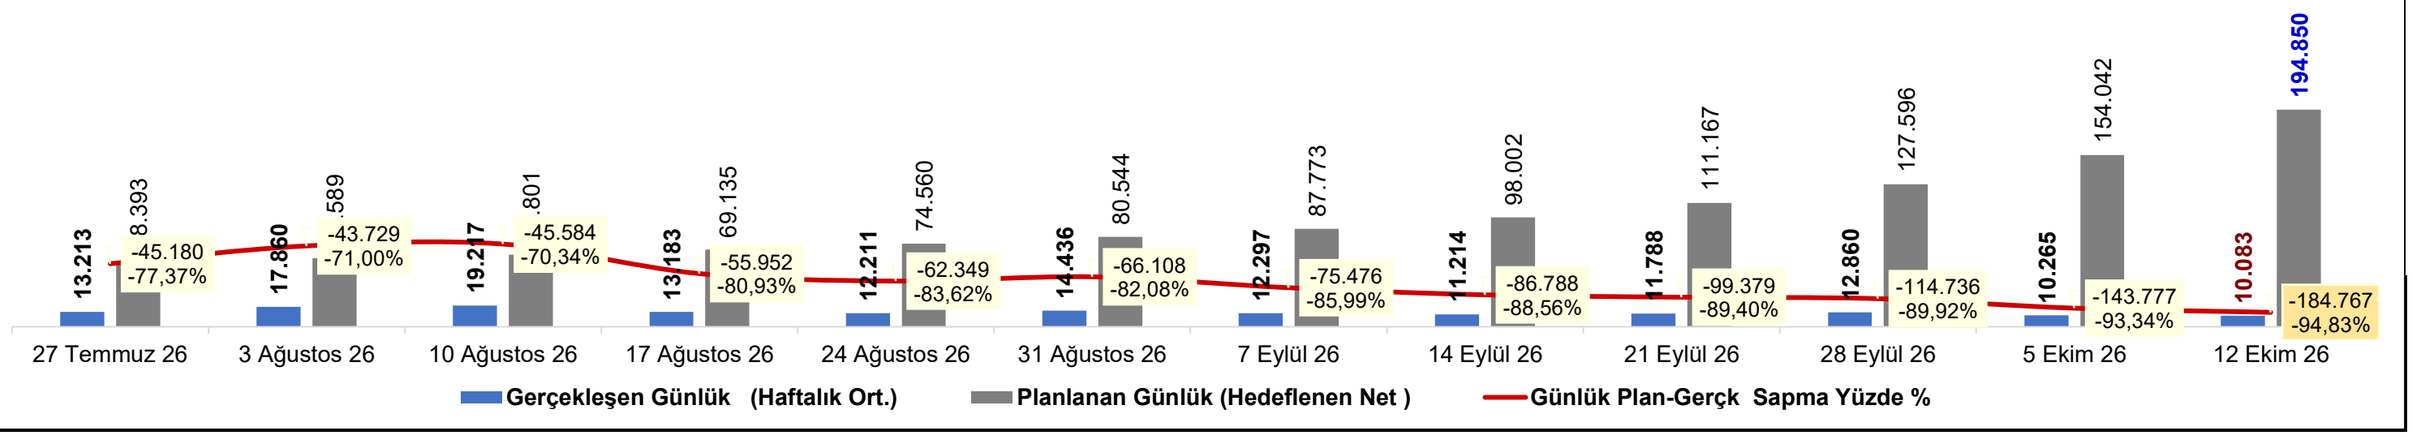

KÜMÜLATİF MİKTARLAR

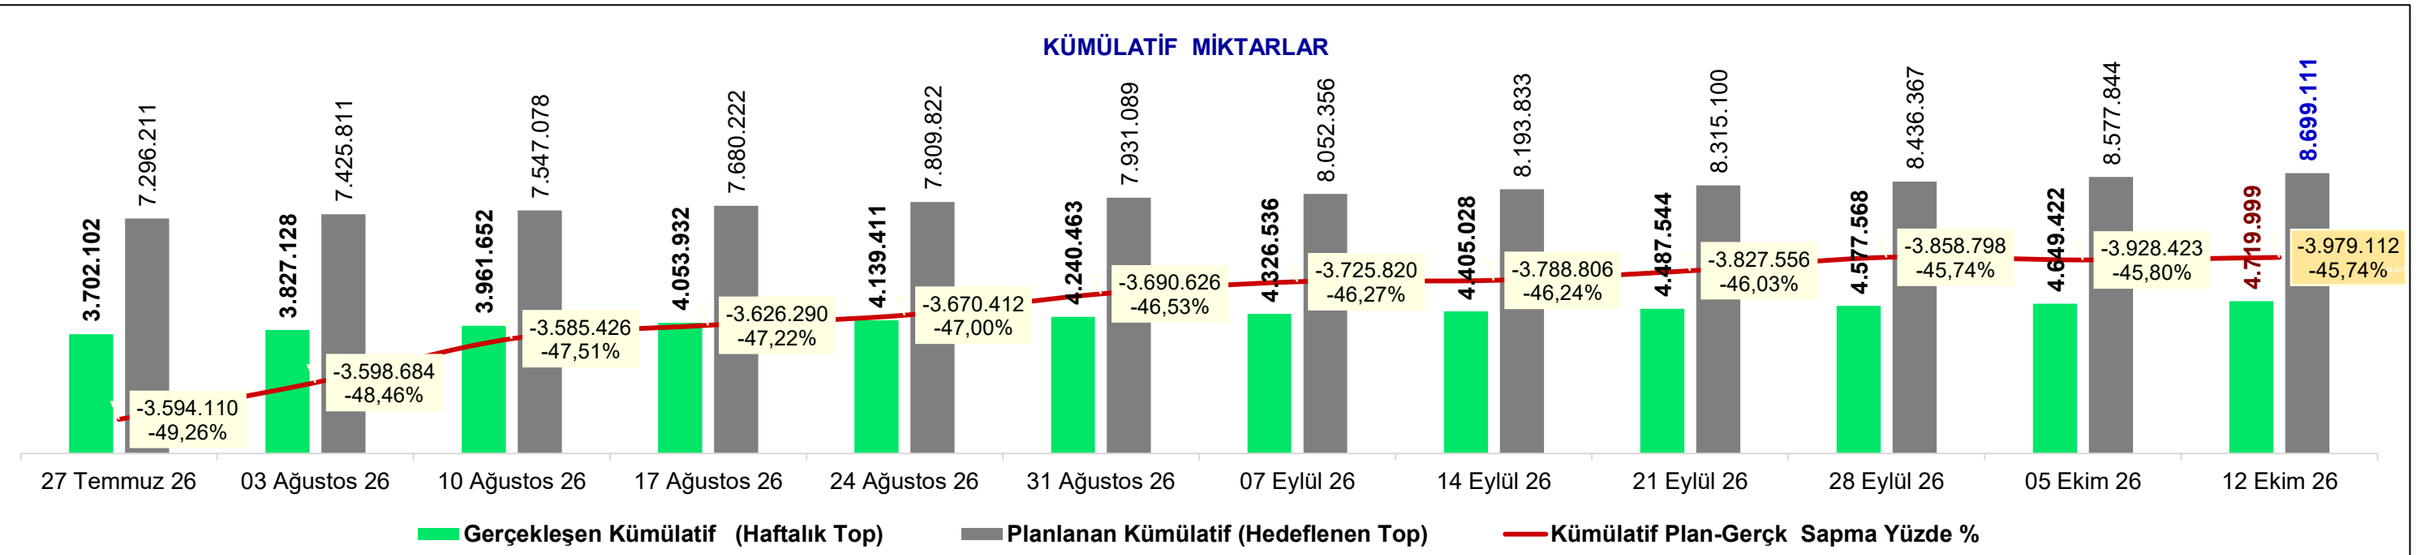


ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

PROJE - İKİ RAP. DÖNEMİ ARASI GEÇEN GÜNE GÖRE PERFORMANS RAPORU - PERİYOT 3 AY (ÇeyrekYıl) - 12.10.2026


İSTİNAT DUVARI G.TOPLAM İMALATI (PP+YP) (m³) / Bu Rapor ve Önceki Rapor Arası Geçen Süre (7 Gün)

!! İş programına göre süresi biten işlerde hedefler çok fazla görülür.

GÜNLÜK ORTALAMA MİKTARLAR (Periyodik Ortalama 2 rapor tarihi arası Geçen Güne Göre)

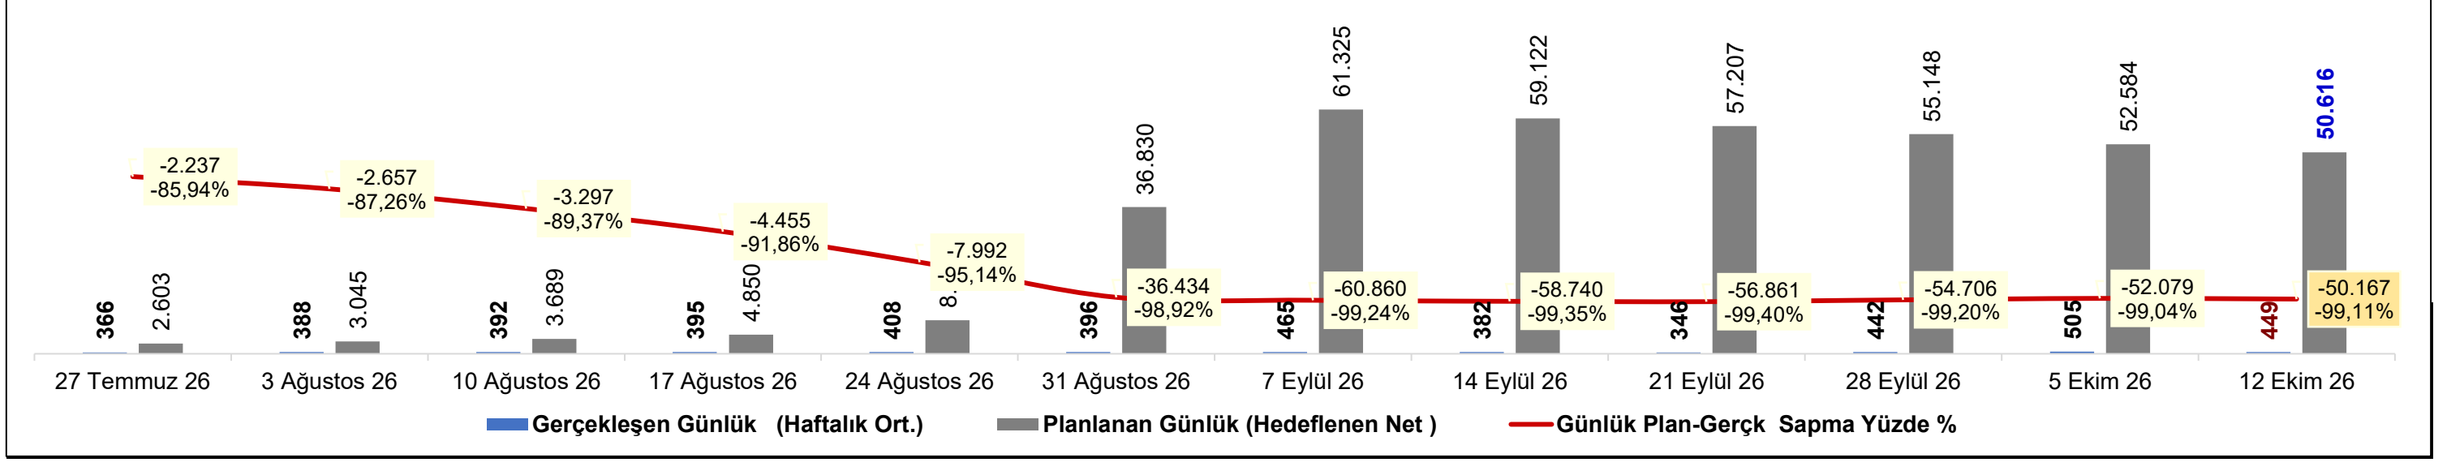

KÜMÜLATİF MİKTARLAR

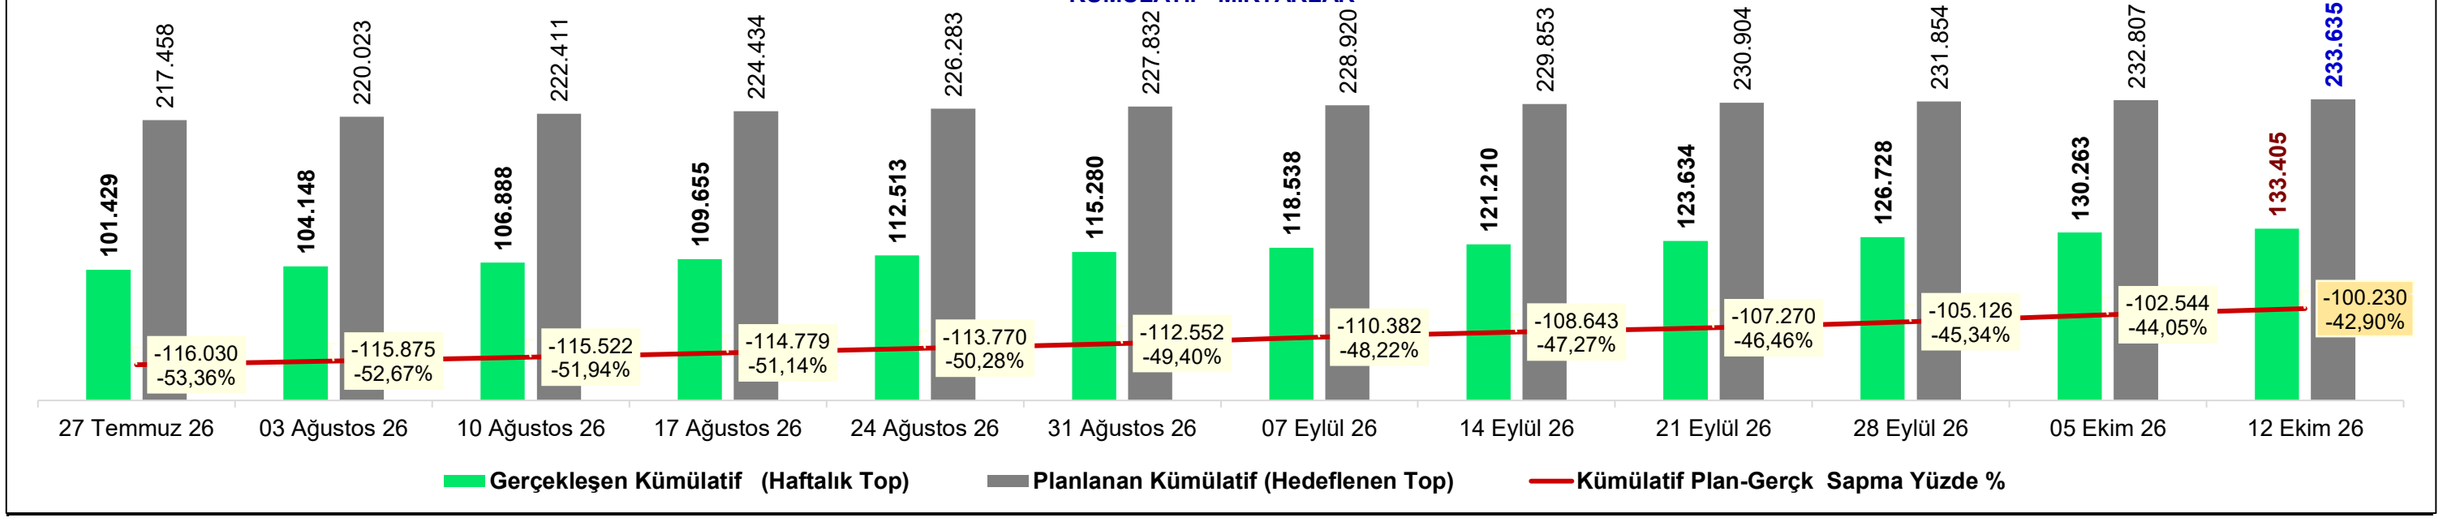

ASO 1. OSB 7. KISIM GENİŞLEME SAHASI ALTYAPI İNŞAATLARININ YAPILMASI İŞİ

PROJE - İKİ RAP. DÖNEMİ ARASI GEÇEN GÜNE GÖRE PERFORMANS RAPORU - PERİYOT 3 AY (ÇeyrekYıl) - 12.10.2026

Proje Genel Fiziksel İlerlemeleri ve Sapmalar (%) / Bu Rapor ve Önceki Rapor Arası Geçen Süre (7 Gün)

PROJE İŞ GRUPLARI	(Tümü)
Gr	G0
SR	(Birden Çok Öğe)

